


Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto

Gerencia de Operaciones y Logistica
Dirección de Unidad de Mina

Agosto 29 2024

terpel



Contenido

Descripción

Imágenes

Operación Terpel en MPSA
Recorrido del Oleoducto


DESCRIPCIÓN

Como parte del recorrido rutinario que hacemos a la línea del oleoducto y con la finalidad de verificar el alineamiento. Todas las válvulas se mantienen abiertas.Presión en la línea del oleoducto 354.03 Kpa . Presión en la entrada del tanque de MSA -0.98 kpa Las presiones se mantienen estables.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 3.57/5.17)

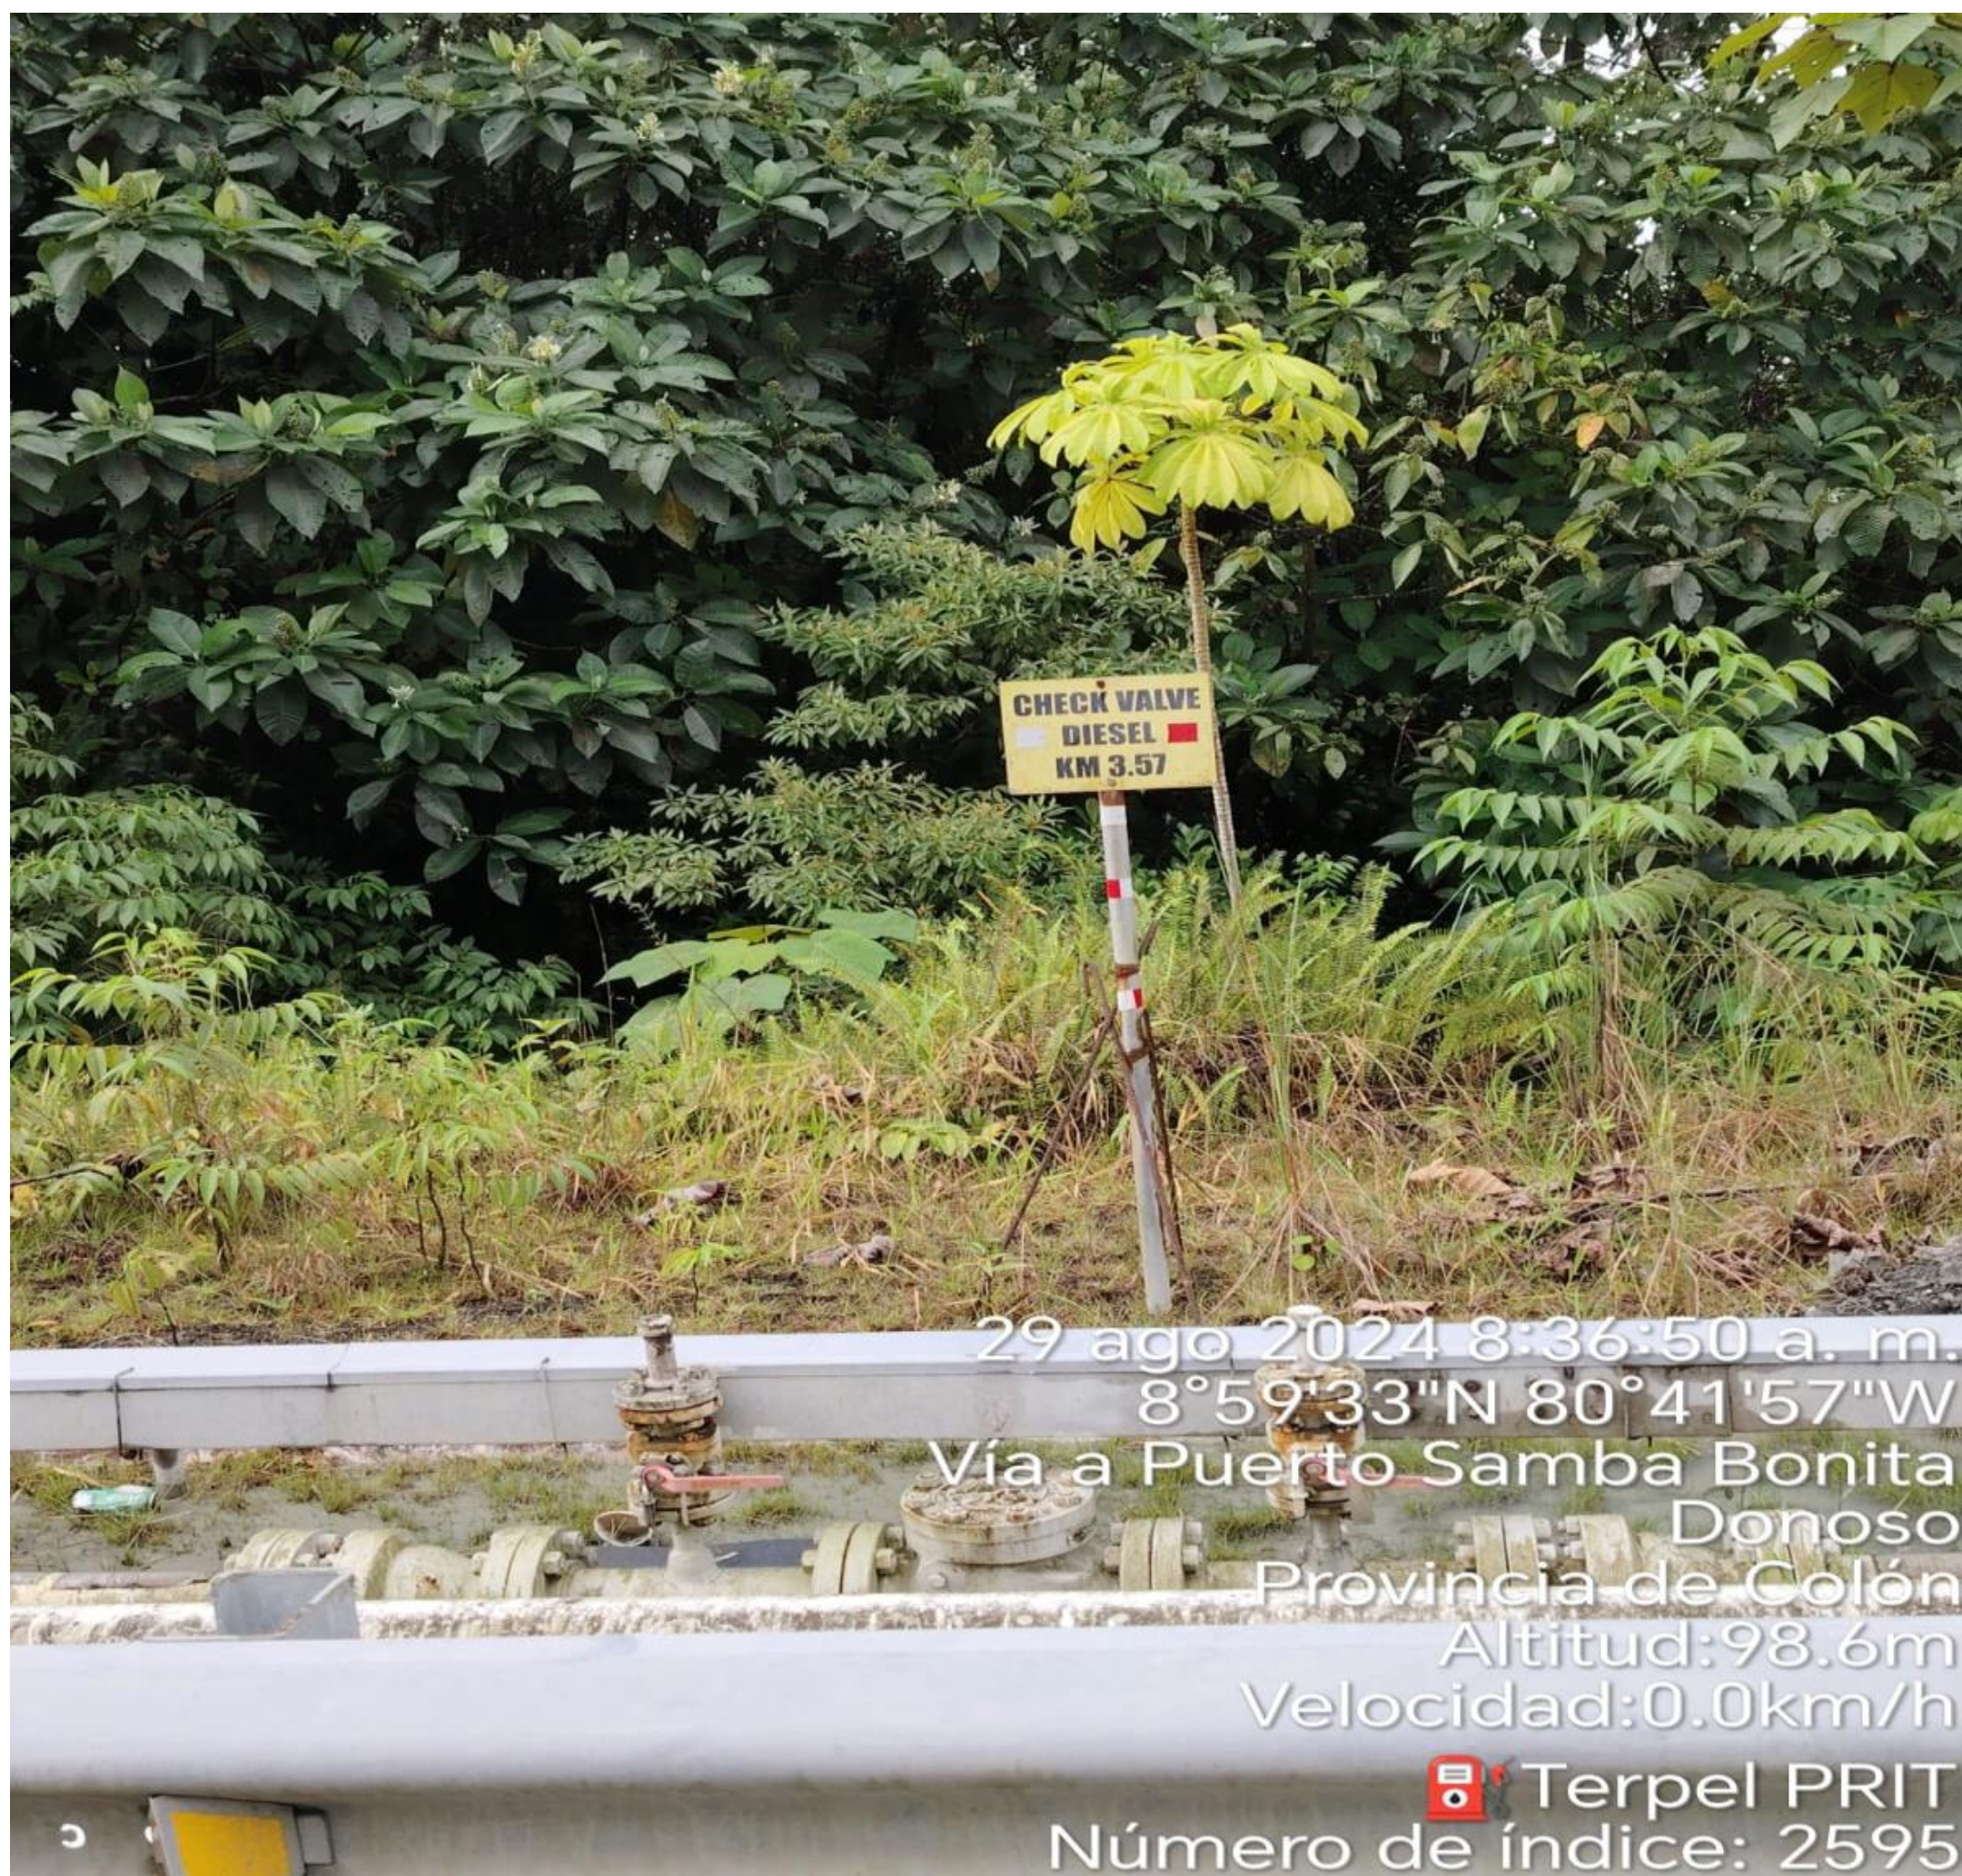



Válvulas check valves 3.57 km mantiene abierta, 5.17 km se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 7.47/8.90)





Válvulas check valves 7.47 km mantiene abierta, 8.90 km se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 10.83/11.62)





Válvulas check valves 10.83 km y 11.62 km se mantienen abiertas.

Recorrido del oleoducto (Válvulas Puente Río Uvero)





Válvulas de compuerta río Uvero se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 13.55)



Válvulas check 13.55 se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 14.00/14.97)





Válvulas check valves 14.00 km mantiene corrosión, necesita ser pintada con pintura anticorrosiva.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Río del medio)





Válvulas de compuerta río del medio se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas 17.4)



Válvulas del km 17.4 se mantienen abiertas.

Recorrido del oleoducto (19.8 Km)



Válvulas del km 19.8 se mantiene abierta.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Punto de reparación)



En el punto de reparación permanece estable.

Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (21.0 km)



Válvulas del km 21.0 (Emulsión) se mantiene abierta.



Válvulas de (Emulsión) se mantiene abierta.



Válvulas del km 22.8 se mantiene abierta.




Válvulas del km 23.8 se mantiene abierta.


Recorrido del oleoducto (29 km) MSA



Válvulas del km 29 se mantiene abierta.


Operación Terpel en MPSA
Presiones

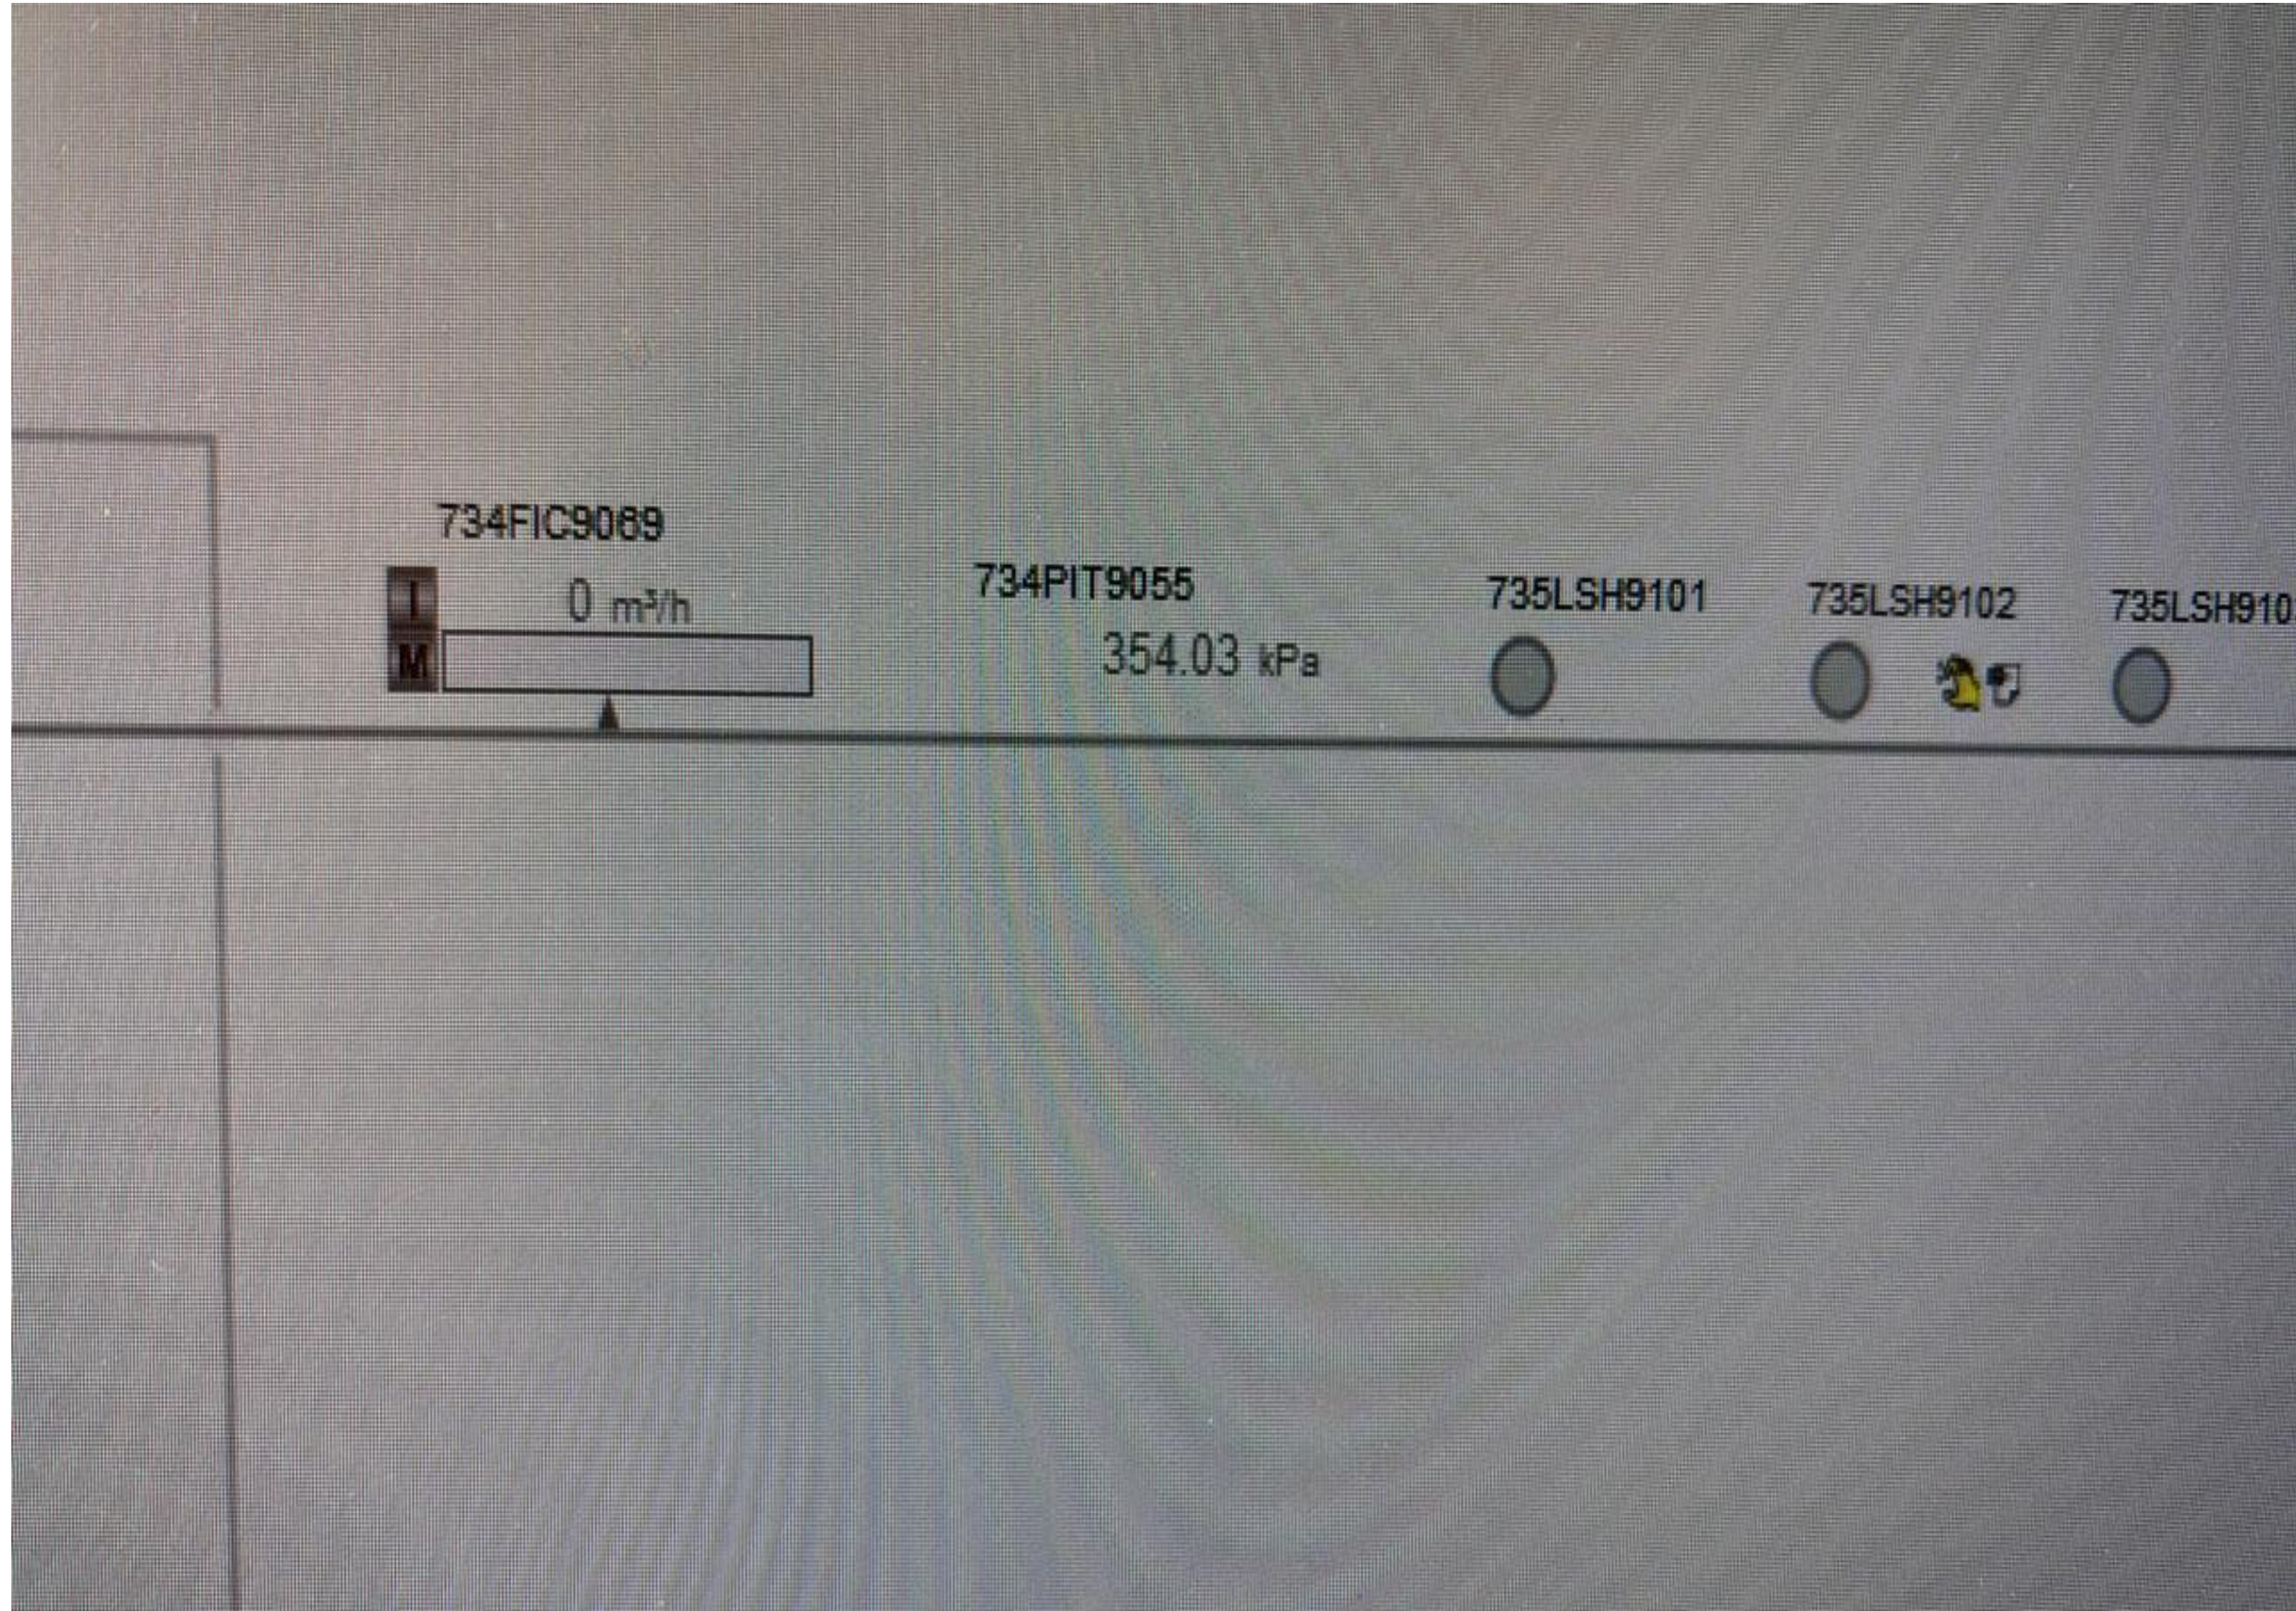

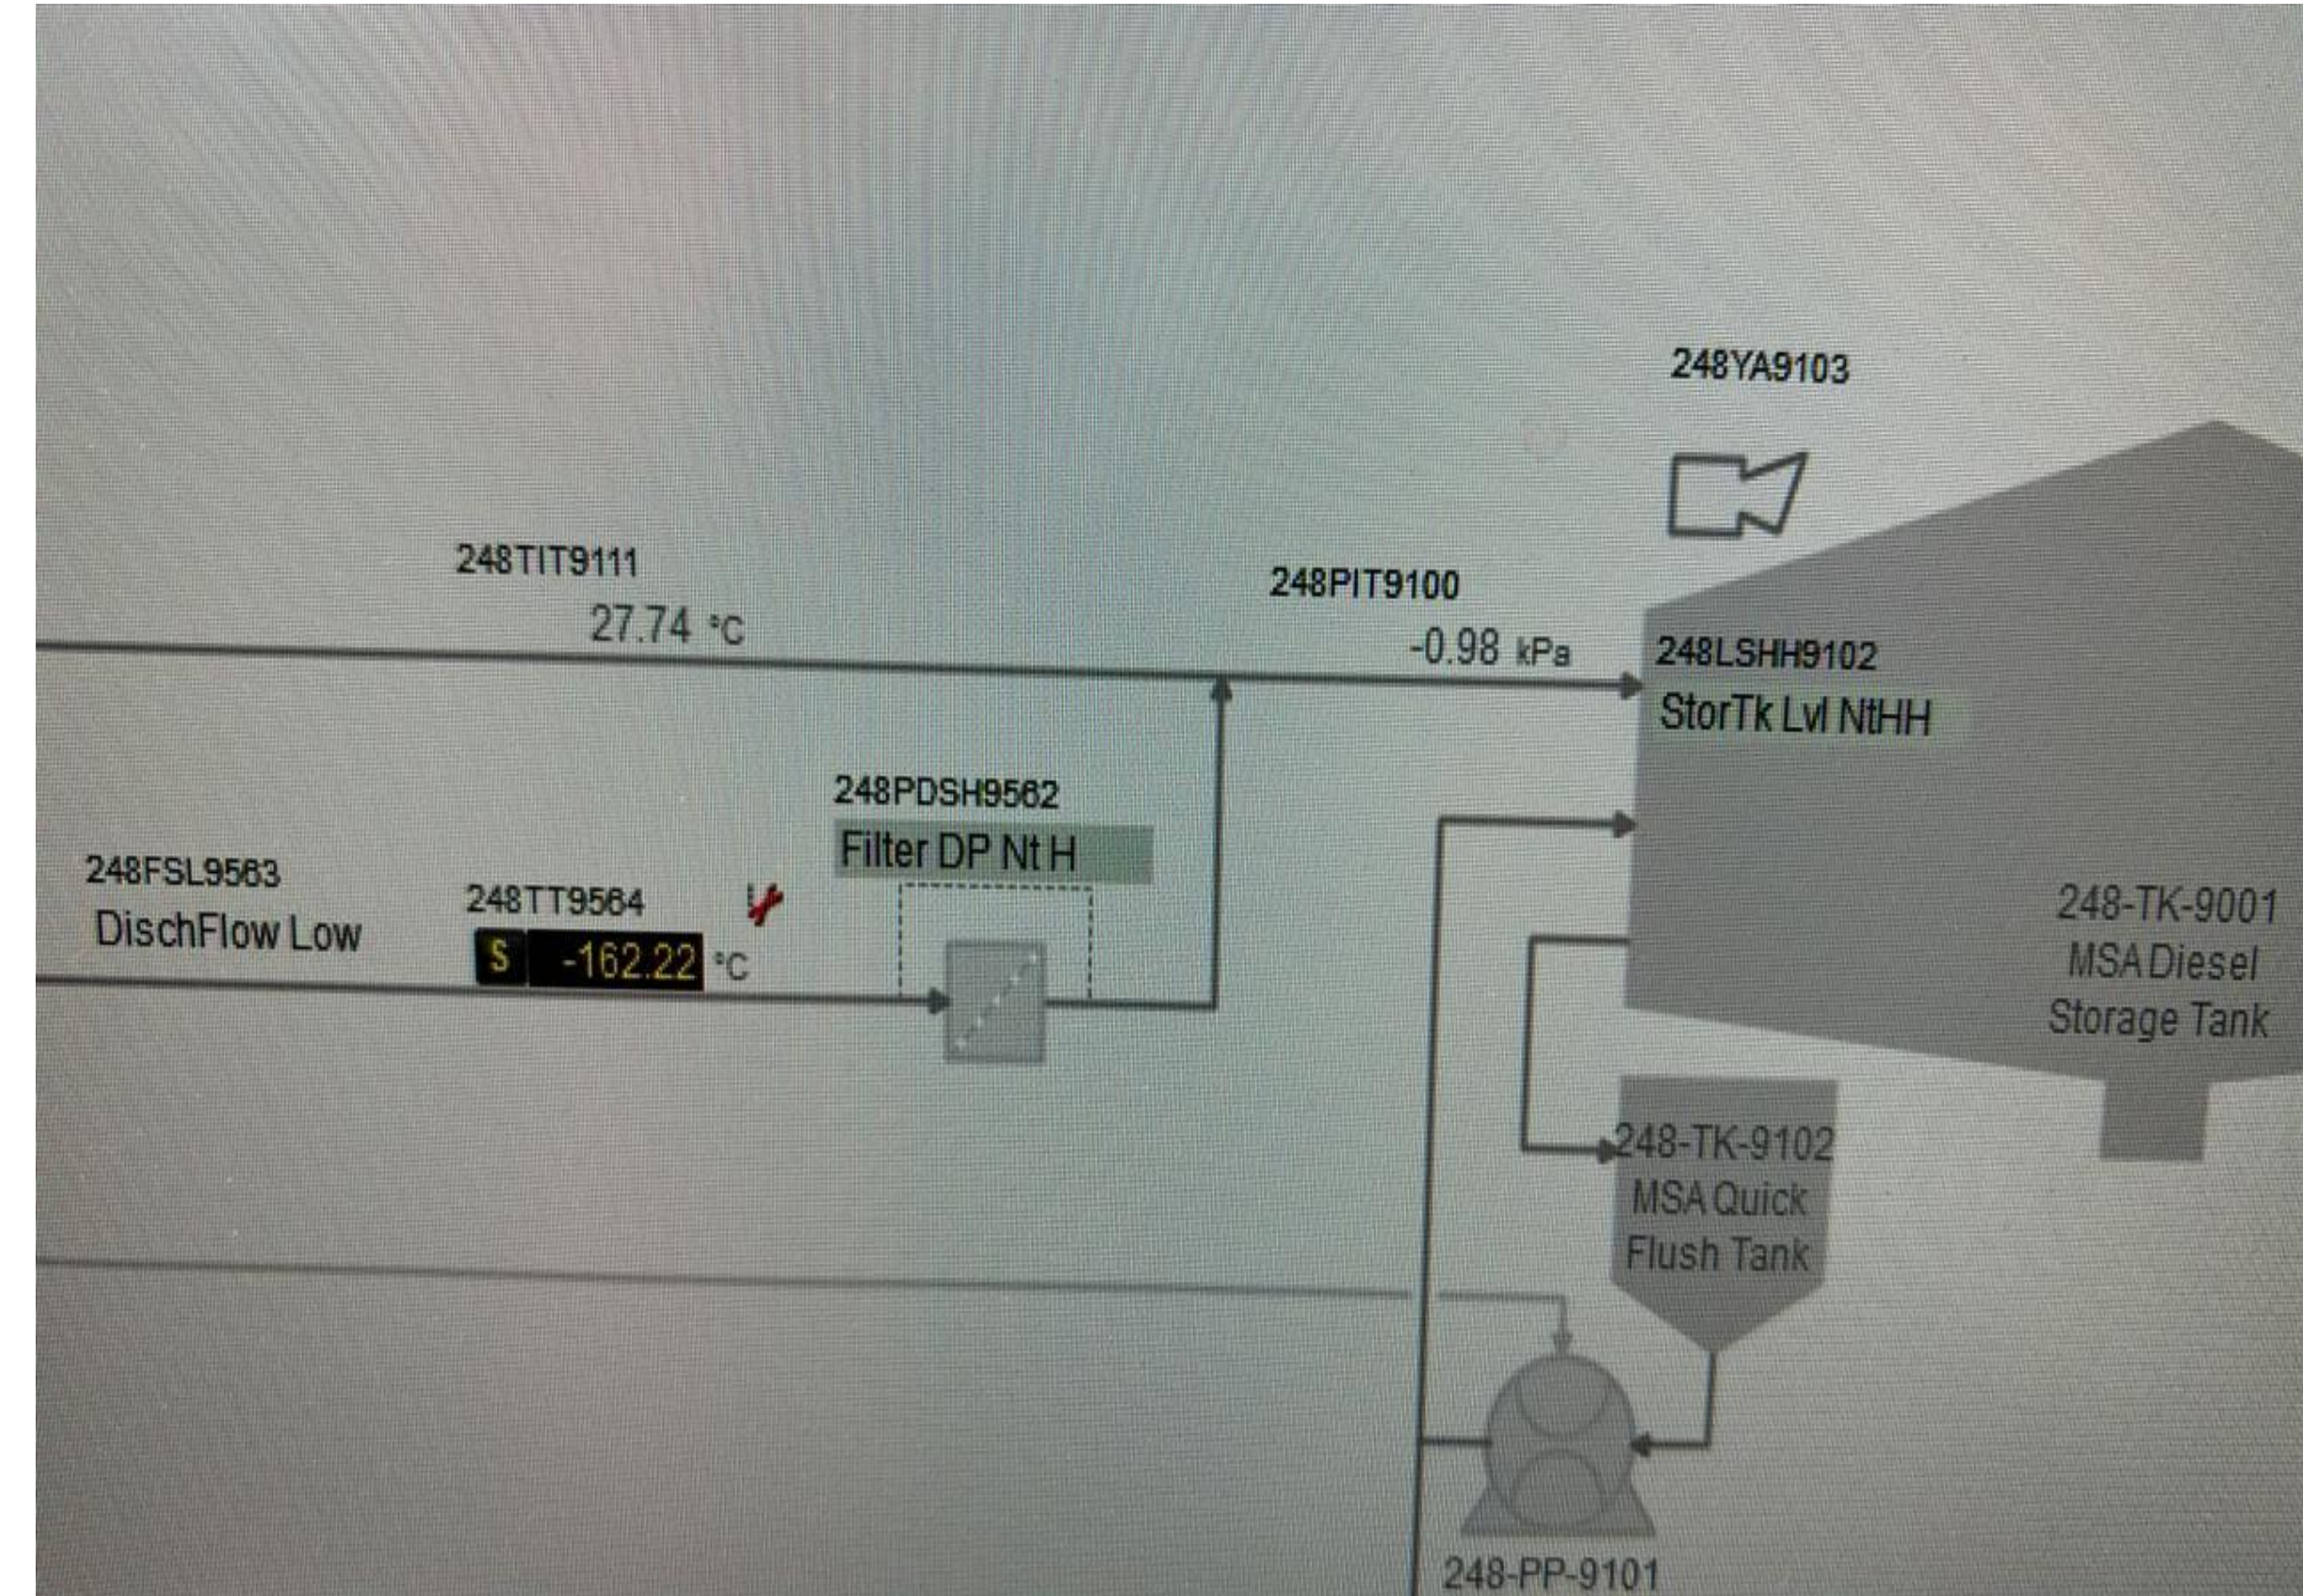

Se mantiene transferencia Detenida hacia sitio Mina Nivel 9001 10.46 % y entre tanques PRIT Apagada nivel 9002 3.76%

Porcentaje de tanque: 13.88 %
Inventario de tanque: 822,797 Lts
Utilizable: 234,944 Lts



Gracias

terpel
